



**Résidence « LA VIGNERAIE »
50 Avenue Jean-Jaurès
78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS**

MAITRE D'OUVRAGE

**Le Syndicat des copropriétaires
De la Résidence « LA VIGNERAIE »,**

Représenté par

**SYNDIC
GENIEZ IMMOBILIER**

1 Avenue Joseph Kessel
CS 40438 MONTIGNY LE BRETONNEUX
78055 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX

MAITRISE D'ŒUVRE

REANOVA

15 avenue Descartes 92350
LE PLESSIS ROBINSON
Tel : 01 81 89 35 00
www.reanova.fr

**REUNION DE CHANTIER
N° 49
DU 18/10/2018**

DIFFUSION PAR MAIL A TOUS LES INTERVENANTS

LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER AURA LIEU

**Le Jeudi 25 octobre à 14h00 avec les entreprises sur site
Puis à 15h30 à la loge gardien avec le conseil syndical.**

LIEUX : LOGE GARDIEN

1. **INTERVENANTS**

• MAITRISE D'OUVRAGE–MAITRISE D'ŒUVRE–BET- ENTREPRISES

INTERVENANTS	NOM	TEL	PORT	FAX	MAIL	Prt	Abst	Convoqué
Direction de projet								
MOA : FONCIA - GENIEZ IMMOBILIER	M. GENIEZ Mme JANOWSKI M. ATTARD M. SAUMONT				christian.geniez@foncia.fr aline.janowski@foncia.fr attard@geniez.fr saumont513@foncia.fr isabelle.roblin@foncia.fr	P		X
Conseil Syndical :	M. MASSON M. PILON M. VALENTIN Mme PRETEUX M. CITAIRE M. DUPAU M. LAZRAC M. LEVEQUE M. ROLLAND Mme SOETAERT Mme RAPOSO M. THOMAS			06 15 49 42 41 06 07 90 17 50 06 15 49 42 41	yvonne.masson@wanadoo.fr jag.harm@numericable.fr titinox@free.fr annie.preteux51@gmail.com sylviephil2@yahoo.fr charlyetelodie@sfr.fr lazrak78@gmail.com regis.leveque@free.fr paul.rolland@bbox.fr sylvie.soetaert@free.fr anarap0@hotmail.com	P P P P P		X
GARDIEN :	M. SISSOKO			07 88 45 17 04	Synd-copr-resid-sous-bois1@orange.fr	P		
ICF LA SABLIERE	M. MANSSOURI Mme VANDAMME Mme AUGER		06 25 65 12 61 06 15 53 63 48 06 79 23 74 11		Abdelhaq.MANSSOURI@icfh abitat.fr emmanuelle.mafille- vandamme@icfhabitat.fr Sandrine.AUGER- COCHUYT@icfhabitat.fr			
MOE : REANOVA 15 avenue Descartes 92350 LE PLESSIS ROBINSON	Mr HUGONENC Mr MAZIERE M. ABASSI	01 81 89 35 03	06 26 06 47 34 07 61 28 73 05		haroldhugonenc@reanova.fr baptistemaziere@reanova.fr skanderabassi@reanova.fr	P P		
BET THERMIQUE / FLUIDES : POUGET CONSULTANT 81 rue Marcadet 75018 PARIS	Mr MULLER	01 42 59 53 64			jonathan.muller@pouget-consultants.fr			
Bureau de contrôle : ALPHA CONTROLE Parc D'activité TRAPPES 46 Avenue des Frères Lumières 78 190 TRAPPES CEDEX	Adamou ALI	01 61 37 09 90	06 20 04 14 20	01 61 37 09 91	aali@alphacontrole.fr			
Coordinateur SPS COREGI 36 Rue Fontarabie 75020 PARIS	M. BETARD M. ECALLE	01 42 85 59 50	06.61.83.15.23 06.61.00.19.49	01 43 72 09 79	conseil@coregi.fr			X

Sans observation écrite formulée sous 5 jours, le présent procès-verbal et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce procès-verbal n'est qu'une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans attendre la réception du procès verbal.

ENTREPRISE								
LOT 01 SPEBI 85 bis rue Jean Le Galleu 94200 IVRY SUR SEINE	M. CORDON M. RIBEIRO M. SAMPAIO M. DA COSTA M. SERPAULT	01 46 58 49 73 01 46 58 49 73	0673459373 0645591139 0667172122 07 86 66 05 89		frederic.sampaio@spebi.fr	P		X
LOT 02 GROSFILLEX Arban SARL 13/15 Rue du Pont des Halles – 94150 RUNGIS	M. KOCAC M. HAVET M. RAVEAU M. CLERET M. CUTULI M. COTARD		06 08 94 99 59 06 60 06 27 12 06 61 66 58 32 06 98 08 83 00 06 66 76 19 66 07 62 78 83 13	01 46 58 86 57	hkocak@grosfillex.com ghavet@grosfillex.com jraveau@grosfillex.com agenceparis@grosfillex.com lcleret@grosfillex.com jcutuli@grosfillex.com	P		X
LOT 03 ETANCHE PRO 8ter Rue du Faubourg Saint Wulfran 91490 MILLY LA FORET	M. CORREIA	01 64 98 55 36	01 64 98 65 09	06 78 90 13 29	etancheopro@wanadoo.fr			X
LOT 04 GECOP 10 Rue Volta 94140 ALFORTVILLE	M. FERNANDES M. DUCROT M. BRIGNIS	01 75 37 68 62	07.61.25.02.02		secretariatgecop94.fr david.fernandes@gecop94.fr damien.ducrot@gecop94.fr	P		X

P : Présent A : Absence Injustifié Ex : Absence Excusée

2. OBSERVATIONS SUR LE PRECEDENT COMPTE RENDU

	CONCERNE
RAS	

3. ADMINISTRATIF

• DECLARATION DE SOUS TRAITANTS

Lot	Désignation Des travaux	Entreprise titulaire	Demande d'agrément sous traitant	Extrait KBIS + URSSAF	impôt	Attestation d'assurance responsabilité civile	Attestation d'assurance biennale et décennale	Certificats de qualification+c hiffres d'affaires	Lutte contre travail clandestin + pôle emploi	Fait le Visa MOEX le Agrément le
01		SPEBI	Verre et Métal	X	X	X	X	X	X	12.01
01		SPEBI	LSH reno	X	X	X	X		X	08.11
01		SPEBI	MNTSASU	X	X	X	X	X	X	12.03
03		GROSFILEX	Mensuierie de F	X	X	X	X	X		21.12
04		GECOP	EDIF	X	X	X	X		X	04.10
04		GECOP	VTI	X	X	X	X		X	04.10
05										

F :Avis favorable ; S : Avis suspendu ; R : Refusé

NB : 1 DC4 originale doit être remise au maître d'ouvrage

Sans observation écrite formulée sous 5 jours, le présent procès-verbal et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce procès-verbal n'est qu'une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans attendre la réception du procès verbal.

4. INFORMATIONS PARTICULIERES (MOA MOE CONCESSIONNAIRES)

MAITRE D'OUVRAGE (CONSEIL SYNDICAL / SYNDIC)

	Date Prévue	Fais-le
Voir avec BOUYGUES TELECOM pour obtenir le dossier technique de la pose des antennes : Support autoportant, sans fixation en dalle et reprise d'étanchéité Passage des câbles par carottage et installation d'une crosse (étanchéité à faire par EtanchePro) Attention au poids sur la toiture	PM	
SOUFFEZ + FORGIT (en cours de négociation) + MOYON (MOZART), etc... : refus la dépose des stores banne -> Lettre d'avocat à faire par le syndic <u>(liste à faire REANOVA (perte garantie, esthétique, perte subvention, annexé au lot, etc...)).</u>	PM	En cours chez REANOVA

MAITRE D'ŒUVRE (REANOVA/POUGET)

	Date Prévue	Fait-le
Note d'information sur les entretiens fenêtres, ventilation, façade + problème de réglage sur menuiserie	PM	
8 DEBUSSY – RDC Gauche – Vérifier commande – LOT 754. Pignon en simple vitrage.	GROSFILLEX	
Revoir refus au 05 LULLY – 1 ^{er} étage MALCIC	ASAP	
HOUMMANE : flocage non fait dans la cave (06.34.67.05.80) : 12 DEBUSSY (ancien DA COSTA FERREIRA)	PM	
RDV à faire avec MOUSSOUR, 6 ^{ème} gauche, 1 OFFENBACH pour la possibilité de garder le store ou non	PM	
Regarder commande GONCALVEZ, au 1 LULLY -> attente fenêtre GROSFILLEX	PM	
Rappeler GODERNAUX, OFFENBACH, 06.30.31.78.26	RDV au 25.10 à 14h00	

<BUREAU DE CONTROLE

	CONCERNE	Date Prévue	Fait-le
Validation des dossiers techniques des entreprises	TOUS		

COORDINATION SECURITE

	CONCERNE	Date Prévue	Fait-le
Voir registre journal	TOUS		

• DOCUMENTS RECUS/EMIS

ENTREPRISE	DOCUMENT	RECU LE	VISA
GECOP	Proposition de contrat entretien (sur 5 ans)	29.03	
GECOP	Retour VTI sur les mortaises dans les fenêtres	29.03	
SPEBI	Plan EXE mis à jour des garde-corps	29.03	
SPEBI	Mise à jour de coupe sur balcon	29.03	30.03
GROSFILLEX	Quitus de pose	29.03	
ETANCHEPRO	Fiches tech. Des garde-corps toiture	29.03	30.03

Sans observation écrite formulée sous 5 jours, le présent procès-verbal et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce procès-verbal n'est qu'une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans attendre la réception du procès verbal.

SPEBI	Plan EXE main courante sur allège	19.04	
CS	Fiche quincaillerie	19.04	
GECOP	Avis de passage pour les carottages dans le GOUNOD	17.05	Modifier logo syndic
GROSFILLEX	Quitus de pose	31.05	
CS	Liste des caves non floquées	07.05	07.05

5. GENERALITES ENTREPRISES – SECURITE - TEMOIN

GENERAL - SYNTHESE	CONCERNE	Date Prévue	Fait-le
<p><u>BARAQUEMENT DE CHANTIER / INSTALLATIONS / PRORATA :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Branchement eau et électricité : mise en place de sous-comptage obligatoire. - Les luminaires extérieurs devront être posés provisoirement pendant les travaux pour garder les extérieurs allumés. - Bien rabattre les échelles au RDC des échafaudages <p>Nombre de personnel prévus :</p> <ul style="list-style-type: none"> -GrosFillex : 6 personnes -EtanchePro : 6 personnes -Gecop : 10 personnes -SPEBI : 15 à 20 personnes. <p>Relevé de compteurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> -EAU : 43m3 -GAZ : 1711,12m3 -Electricité : 23017KwH (04662129144) 850KwH (04166216058) <p>Au 18/10/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bâtiment Gounod indice de départ 000608.7 KW indice au 16 octobre 007131.5KW • Bâtiment Rameau indice de départ 001478.00KW indice au 16 octobre 001924.49KW • bâtiment petit Debussy indice de départ 0 KW indice au 16 octobre 000435.50 KW 		PM	
<p><u>SECURITE :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fournir PV de contrôle des nacelles, échafaudages au fur et à mesure - Convention d'échafaudage pour les autres entreprises. 	<u>TOUS</u>		
<p><u>TEMOINS / ECHANTILLON : SUR LA LOGE GARDIEN</u></p> <p>Façade béton STO 79100 Façade ventilée STO 71433 Volet RAL 7011 Sable + Bavette + garde-corps Profilé de départ en RAL 9003 pour les allèges des façades.</p> <p>Teinte soubassement : STO 71433 (dito façade ventilée)</p> <p>Poteaux de chaque côté des entrées : STO 71433 Casquette en blanc : STO 79100</p> <p>Teinte des édicules et souches en toiture ; STO 79100</p> <p>Teinte RAL des SEL sur loggias : gris clair 7044</p> <p>Porte des halls : Pour des raisons de tenue dans le temps, nous proposons de mettre en place un seul ouvrant, avec une largeur de passage entre 100 et 110cm, sans porte tierce. Nous ne mettrons pas de butée aimantée permettant de laisser ouvert le vantail : risque pour la sécurité. Livraison de la porte : RETARD dans le témoin. Pose dans la foulée de la réception. PREVU le 19/10/2018 -> 05 GOUNOD. Nous rappelons l'application de pénalité.</p> <p>GAINE capotage : validé en blanc sur tous les pignons.</p> <p>Portes des caves : Réaliser un témoin à la rentrée. RAPPEL URGENT</p> <p>Garde-corps : BUGAL (premier prototype montré) en RAL 7011. « Détacher la main courante » selon demande du conseil syndical.</p>	SPEBI		

Sans observation écrite formulée sous 5 jours, le présent procès-verbal et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce procès-verbal n'est qu'une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans attendre la réception du procès verbal.


6. AVANCEMENT DES ENTREPRISES - PLANNING

DATE DE DEMARRAGE EFFECTIF : LUNDI 09 octobre 2017

DATE DE FIN DE CHANTIER : 31 décembre 2019 derniers délais et avec intempéries

Intempéries au 29/03/2018 : 66 jours

ORDRE D'AVANCEMENT :

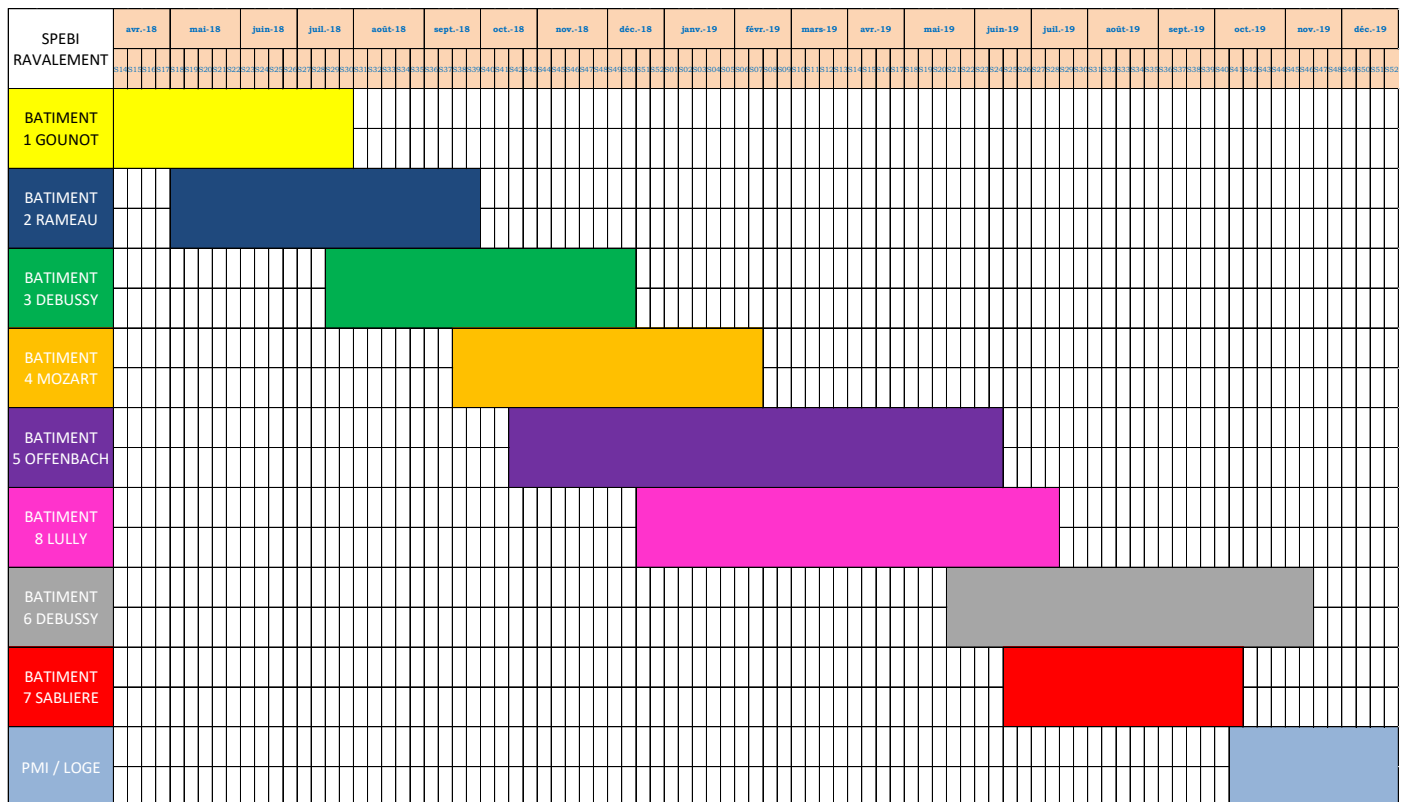

Attention à prévoir les intempéries et l'hiver dans le planning global : le chantier doit être terminé, payé et réceptionné au 31/12/2019 pour ne pas perdre les subventions, prêts, etc...

Une nouvelle équipe sera peut-être à prévoir.

Réalisation du prototype porte de hall en septembre (pose d'une porte en modèle) + Témoin sur les travaux intérieur sur le même hall choisi : **RAPPEL !!**

Déposer les volets coulissants en RDC le plus tard possible pour des raisons de sécurité (pose des ossatures sur les étages avant).

Reprise flocage sur GOUNOD à partir du 10.09.2018

- Fin GOUNOD jusqu'au 21/09
- Rameau et Petit Debussy : à partir du 24/09 pour 3 jours
- Offenbach à partir 26/09
- Lully à partir du 27/09
- Sablière et DEBUSSY le 28/09 et si besoin le 01/10

SEPBI :

Fournir liste des caves non faites (SPEBI) - > convoquer le floqueur semaine prochaine.

Ordre ETANCHEPRO pour la fin des travaux :

- Grand Debussy
- PMI
- Sablière
- Gounod

Sans observation écrite formulée sous 5 jours, le présent procès-verbal et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce procès-verbal n'est qu'une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans attendre la réception du procès verbal.

-Rameau

Pour mémoire, conformément au CCAP page 05 La pénalité prévue à l'article 9.5 du CCAG est fixée à 1/2000ème du montant TTC du marché par jour calendaire de retard.

Par dérogation au CCAG, elle est appliquée sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable et est plafonnée à 15% du montant du marché.

7. SUIVI DES TRAVAUX

LOT 1 FACADE - SPEBI

Remarques du jour / Validation :

-Plusieurs appartements à traiter. (Traitement en fin du bâtiment, à charge de l'entreprise SPEBI – Déduction de la facture si nécessaire.) En cours.

-Appartement MEAUX, 4 Gounod : vitrage rayé.

-Appartement RIBEIRO, Gounod, vitrage

-Appartement NOUNO SALLES, 4 Gounod, limaille

-Appartement DE CARVALLIO, 1 Gounod : vitrage rayé

-Appartement MEANCE, 3 GOUNOD, 4^{ème} Vitrage rayé/piqué

-Vitrage avec impact : POIROT HELENE - 1 RAMEAU, RDC 07.61.46.72.99 / mel2312@msn.fr

-Appartement Amar, 3 Rameau RDC. **En cours**

-Appartement SIVAZLIAN 4 GOUNOD, vitrage rayé.

-Appartement RITO, 1 Rameau : Vitrage piqué.

-Appartement CUPERLIER : problème vitrage piqué.

-**SOUFFEZ, MOZART, 5^{ème}**

-**GODERNEAUX au GOUNOD**

-**DAUVERGNE LECLERCQ au MOZART**

-**OFFRET au Mozart**

-Contrôler vitrage rayé :

-PIRES / CORREIA, 1 Gounod, RDC droite

Encore des nouvelles vitres abîmées sur le 1 MOZART. Protection non mise !!!!

-Remarques plans Portes :

Bâton de maréchal plus haut coté extérieur

Ne pas oublier l'inversion alimentation électrique (gâche et ventouse)

-Manque un capot pour la gaine technique, côté terrasse + laine de verre.

-Les grilles de défense sont à remettre pour les RDC en pignon : Témoin validé. Espace maximum de 11cm entre les deux barres.

-Traitement des entrées en flashings gris (pas de SEL, support non conforme).

-Suppression du carrelage en pied de PMI + surfacage avant mise en peinture.

-Isolation du soubassement en PSE 12cm dito DCE.

-Réaliser un joint entre les allèges des garde-corps plein du 03 GOUNOD et le pignon du 04 GOUNOD (JD)

-Bien régler les volets le plus loin possible à l'ouverture (constaté sur les nacelles du Rameau réceptionnée ce jour).

A réaliser pour le prochain RDV :

-Continuer travaux

-Recommander des esc. (4 sont perdus à ce jour). En fin de chantier flocage.

-Réserves toitures :

-Terminer joint PU

-Les couvertines en pignon sont trop inclinées : pas de protection en tête de l'ITE coté extérieur.

-Pose capot blanc gaine pignon créée, côté intérieur.

-Revoir jonction couvertines avec gaines, décroché pignon, façades.

-Pose des balais latéraux en essai chez Anthony au 02 GOU ;NOD : Validation sur le GOUNOD, avec rivet pop teinte blanche. Pose en même temps que les fléaux.**RAPPEL. Fin à voir pour le 15/11/2018**

-Etaï tombé sur le tablier de Mme SOETAERT : voir avec GROSFILLEX pour remplacement si nécessaire. Remplacer la bavette PVC qui gêne le volet roulant existant

-Problème doublage brique intérieur acrotère GRAND DEBUSSY : Sondage fait. Diag amiante à faire avant toute prise de décision.PAS D'AMIANTE (voir DAAT). remonté en **CIPOREX -> DEVIS**

-Cornière STOVENTEC cote PF sur balcon mal posé malgré relance : 02 GOUNOD, 3^{ème} étage, Madame MARIBON.

Sans observation écrite formulée sous 5 jours, le présent procès-verbal et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce procès-verbal n'est qu'une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans attendre la réception du procès verbal.

-Nettoyer cave M. ANTOINE au 01 GOUNOD.
-Bien dégager les pieds des vannes en sous-sol avec le flocage.
-Contrôle cave 10 DEBUSSY – LEMARDELE : néon noyé dans le flocage
-Applique trop proche d'une vanne d'arrêt au 1 DEBUSSY, sous-sol. Revoir la position avec l'électricien.
-> 2 OFFENBACH, luminaire noyé dans le flocage .

-Convoquer sous-traitant flocage pour mise au point des caves restantes. RAPPEL.

-Faire un point sur les avis / retours bureau de contrôle - > En cours.

-Nettoyage du chantier à faire rapidement.

-Passer chez MARIBON au 02 Gounod pour finir sa loggia (cornière angle aluminium + finition). URGENT.

Point Techniques :

- Installer une bavette puis capoter la gaine du petit pignon GOUNOD

-Décapage des édicules et intérieur d'acrotère en toiture : prévoir I4 (mauvais état des supports à revoir également)

Mettre en place un isolant de 3cm en sous-face d'allège sur façade principale (aucun pont thermique possible). Pour le pignon, voir avec l'épaisseur à mettre en soubassement pour isoler ce déport.

Mise en place d'une cornière aluminium thermolaqué sur les joints de construction important en sous-face de garde-corps maçonné rapporté (plafond du balcon en dessous).

LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES : GROSFILLEX

Remarques du jour / Validation :

-Des dégâts semblent avoir eu lieu dans la cage d'escalier (2 Rameau) : applique et porte ascenseur.
-Trop de problème de réglage et pb volet roulant : déparcloser, recalcr le vitrage, revoir cale sur milieu de l'ouvrant.
-Rappel : Nous bloquons toutes les situations financières en attendant les solutions et reprises

A réaliser pour le prochain RDV :

Si les quittus ne sont pas lisibles et bien repéré, ils ne seront pas valables / pris en compte = pas de paiement.

Pour information : sav-paris-grosfillex@grosfillex.com / ou 01 46 58 86 57

Retour sur RDV Mme HUREL (3 Mozart) : fournir explication / Schéma

Reste encore des volets roulants mal placé !!! RDC Debussy et 3^{ème} 1 Debussy

INTERVENTION le 25/10/2018 :

Revoir réglage fenêtre FERREIRA – 1 OFFENBACH – 9^{ème}
Revoir réglage fenêtre ESCOMEL 1 OFFENBACH. RAPPEL
Contacter M. GUIONNET, 2 GOUNOD, 7^{ème} (0610499136) – PF coulissante à régler
Contacter M. CHETIEN, 1 Rameau : Problème sur PF coulissante. + finition pièces Wc et SDB
Contacter DA SILVA DA COSTA : 2 Lully RDC : vitre avec éclat à la livraison.
BENOIT, 02 RAMEAU – problème de réglage porte-fenêtre.
PINEAU 05 OFFENBACH, problème de réglage.
Contacter RAPOSO DOS SANTOS, 08 allée DEBUSSY, 06 18 96 19 74 : Joints PF, une vitre rayée et volet roulant bloqué.
Contacter VALTENTIN, 02 GOUNOD, réglage PF, cuisine et volet roulant.
Contacter CORTINOVIS : pb porte-fenêtre.
Contacter GADOIS : 06.83.29.99.22 au 4 OFFENBACH. Pb de volet roulant (retour le 01.09.2018)
Contacter BOULATOV au 06 01 79 20 39 au 05 DEBUSSY, 6^{ème} droite : pb porte-fenêtre.
Contacter CHABON, 8 Debussy : réglage fenêtre
Contacter LE BOUDER, 05 GOUNOD, réglage fenêtre.
Contacter Ponnuthurai Srikanthan, 1 OFFENBACH, 2^{ème} gauche. Pb PF coulissante.
Contacter ROY, 3 Offenbach, 2^{ème} droite : problème fenêtre chambre.
Contacter PRETEUX, Petit Debussy : réglage fenêtre.
Contacter FOURNIER, GOUNOD, réglage fenêtre.
Volet FERREBEUF : encore en panne. Prévoir un remplacement du volet 5bricolage provisoire fait pour fonctionnement).
Mme SOATERT (03 GOUNOD): Remplacer la bavette PVC qui gêne le volet roulant existant
Contacter PENHOET Christine : 06.16.17.31.13 : problème réglage.
Contacter CORREIA DA COSTA au 02 Lully : Relance du pb de fenêtre
Contacter PONNUTHURAI, 01 offenbach au 07 50 21 59 68 RELANCE.
Contacter LARGUIT – 5 Allée LULLY – 4^{ème} gauche : réglage fenêtre SDB
Contacter OUTERQUITH, Mozart, réglage fenêtre.
Contacter « Gestion + » au 5 Offenbach, 7^{ème} droite, réglage fenêtre.
Contacter « ROUSEAU, 3 Debussy, 3^{ème}, réglage fenêtre.
Contacter EREAC au 02 OFFENBACH, 5^{ème} Problème.

-Etais tombé sur le tablier de Mme SOATERT : facture à SPEBI si besoin (contrôle par GROSFILLEX).

Sans observation écrite formulée sous 5 jours, le présent procès-verbal et ses annexes seront réputés acceptés sans réserve. Ce procès-verbal n'est qu'une confirmation écrite de la réunion ; les intervenants doivent donc prendre acte des demandes qui leur sont formulées lors de la réunion sans attendre la réception du procès verbal.

Recommander une menuiserie pour la cuisine de la loge gardien R+1 (sens d'ouverture à revoir) + reprise des dégâts sur les murs.

Point Techniques :

LOT 3 ETANCHEITE : ETANCHEPRO

Remarques du jour / Validation :

-Des opérateurs doivent s'installer sur les toits de la PMI et GRAND DEBUSSY (planning, besoins techniques). Prise de contact à faire entre les intervenants et REANOVA.
Attention à voir pour décaler intervention du GRAND DEBUSSY pour avoir le retour de l'installation de l'antenne avant (crosse passage de câbles, socle béton, etc... ?)

Problème doublage brique intérieur acrotère GRAND DEBUSSY (devis par SPEBI) : merci d'être présent le jour de l'intervention (à partir de Mardi)

A réaliser pour le prochain RDV :

- Continuer pose complexe isolation ;
 - PMI
 - Sablière
 - Gounod
 - Rameau

Fournir justificatif hauteur du garde-corps au droit des JD

Fournir devis pour combler le manque de gravillon sur la Sablière.

Fournir devis pour remplacement des lanterneaux de la PMI.

Point Techniques :

-Les couvertines seront posées par le ravaleur : attention car les derniers bâtiments ne seront traités que dans 18mois (prévoir une protection en tête provisoire des relevés).

LOT 4 VENTILATION : GECOP

Remarques du jour / Validation :

- Attention aux éclats en plafond (installation des témoins lumineux, reports d'alarme) : à reprendre.
- Ne pas oublier les auvents extérieurs sur les EA.

-Témoin escalier : attribué par « unité de gestion ». Plan de recollement à fournir.

A réaliser pour le prochain RDV :

-Fournir 2 moteurs supplémentaires dans le cadre de l'entretien de la résidence. (à voir en fin de chantier)

-Ventilation loge gardien en caisson individuel : livré.

QUITUS RECU PAR REANOVA, en cours de contrôle.

-Remplacement d'une porte intérieur chez Mme DA SILVA, 2 GOUNOD.

-Contacter M.GUIONNET, 2 GOUNOD, 7^{ème} (0610499136) – Pb ventilation (plaque obturation SDB), détalonnage mal fait. Remplacement.

-Contactez MOYON, 7^{ème} au 1 MOZART : Porte blindée abimée par l'échelle de service : 06 78 69 09 31. -> refus de prise en compte GECOP. Expertise.

-Prise de RDV chez THIMON pour pose de son chauffe-eau avant fin du mois. RDV pris.

-Menuiserie cassée lors des travaux de ventilation : SAKHO, 1 DEBUSSY, 1^{er} étage.

-POUR LA PMI :

-Voir pour mettre des moteurs individuels dans les locaux pour faciliter l'évolution.

-Merci de mettre en service RAMEAU, DEBUSSY, MOZART (attention aux mortaises), puis au fur et à mesure.

Point Techniques :
